

Liikuntasalin valkokangas asennettu


A-lohkolla käynnissä olevia työvaiheita ovat pääasiassa kaluste- ja varusteasennukset (mm. kenkä- ja naulakkokalusteet). Näihin lukeutuvat esimerkiksi luokkien opetusnäyttöjen asennukset.

B-lohkolla jatkuvat ruokailuaulan rimaseinä- sekä kattoasennukset. Toisessa kerroksessa tehdään alakattolevytyksiä sekä väliovien asennuksia ja listoituksia. Kolmannessa kerroksessa jatkuvat varusteasennukset.

C-lohkolla liikuntasalin yläkatsomorakenteiden runkotyöt ovat valmistuneet. Katsomon laatoitustyöt ovat alkaneet tällä viikolla. Liikuntasalissa valmistellaan ensi viikolla alkavaa urheilulattian asennusta.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,17 %. Työmaalla on työskennelty 634 päivää tapaturmitta.

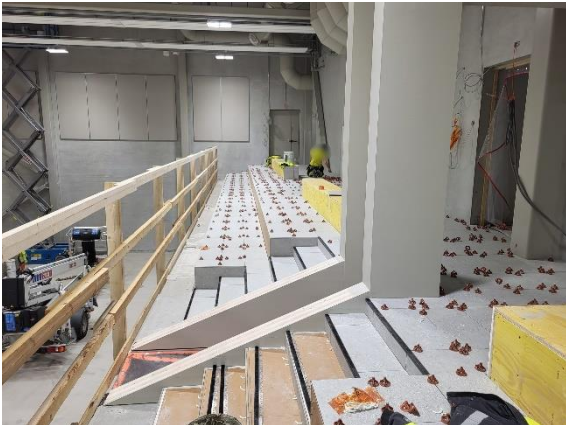

Kuva Katsomolaatitukset
käynnissä



Kuva Valkokangasasennus
käynnissä



Kuva Ruokailuaulan rimaverhousta



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu
