

Liikuntasalin lattian työt vauhdissa

A-lohkolla on aloitettu toisen ja kolmannen kerroksen lattioiden ja kalusteiden suojiin poistot ja valmistaudutaan toimintakoesiivousten aloittamiseen. Pääportaan kaiteissa ovat käynnissä käsijohteiden asennustyöt. Pehmeiden käsitöiden kiintokalusteiden asennustyöt jatkuvat ensi viikon lopulla.

B-lohkolla jatkuvat ruokailuaulan rimakattoasennukset. Pääsisäänkäynnin ulko-ovet on asennettu. Kolmannen kerroksen luokahuoneiden lattia- ja kalustesuojien poistaminen on myös käynnissä. IVKH:ssa ovat käynnissä siivoustyöt toimintakokeita varten.


C-lohkolla liikuntasalin yläkatsomorakenteiden valmistuvat tämän viikon aikana. Liikuntasalissa on aloitettu urheilulattian asennustyöt. C-lohkon toisessa kerroksessa ovat olleet käytävien pintamaalaustyöt käynnissä ja maalaustyöt siirtyvät ensi viikolla ensimmäiseen kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa ovat myös pukuhuoneiden kipsialakattotyöt käynnissä.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,52 %. Työmaalla on työskennelty 641 päivää tapaturmitta.



Kuva Ruokailuauulan valaisimia

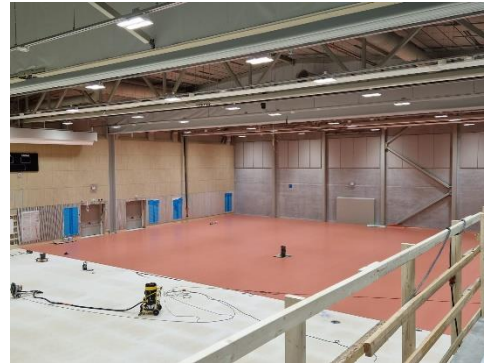

Kuva liikuntasalin lattian
asennustyö käynnissä



Kuva A-lohkon Kenkäkalusteita



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu
