

Betonielementtiasennukset ovat valmistuneet

A-lohkolla toisenkin kerroksen kevyet väliseinätöitä ovat pääosin valmistuneet. Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät väliseinätöiden mukana toisessa kerroksessa. Lohkon pintalaatat ovat valettu myös kolmannesta kerroksesta sekä maalaus- ja tasoitetyöt on aloitettu. Julkisivumuuraukset ympäröivät A-lohkoa jokaiselta sivulta, joista länsisivu on valmistunut. Eteläisivulla sisäänkäyntikatosten pystytystyöt ovat alkaneet. Vesikaton pintakermin sekä läpivientien asennustyöt jatkuvat. A-lohkoa osastoidaan P1- alueiksi vaiheittain, joita myöten myös IV-asennuksia toteutetaan. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen seinälaatoitustyöt jatkuvat, joista keittiön laatoitus- sekä vedeneristystyöt ovat hyvässä vauhdissa. Ensimmäisessä kerroksessa ovat A- lohkon tavoin P1- osastoinnit meneillään, kuten myös IV-työt.

Toisessa ja kolmannessa kerroksessa jatkuvat tasoitus- ja maalaustyöt. Viimeisen pinta- laatta osion valmistelevat työt ovat meneillään kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkon liikuntahallin seinäelementtien asennustyöt ovat valmistuneet. Maanvaraisen laatan valmistelevat työt jatkuvat. Pukuhuoneiden väliseinien muuraustyöt jatkuvat. Toisessa kerroksessa tehdään töitä pintalattioiden valmistelu- ja valutöiden parissa.

A-lohkolla jatkuvat muun muassa julkisivumuuraukset, maalaus- ja tasoitetyöt sekä sisääntulokatosten rakennustyöt.

B-lohkolla aloitellaan toisen kerroksen väliseinätöitä. Kolmannen kerroksen pintalaatan valmistelu ja valutyöt jatkuvat. Laatoitustyöt jatkuvat B-lohkon ensimmäisessä kerroksessa.

C-lohkon liikuntahallin osalta jatkuvat pohjatyöt sekä runkotöissä siirrytään katon asennukseen. Koulun puolella väliseinämuuraukset ensimmäisessä, sekä lattiatyöt toisessa kerroksessa jatkuvat.


Viikolla 22 NCC:n työmailla vietetään työturvallisuusviikkoa. Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,61 %. Työmaalla on työskennelty 333 päivää tapaturmitta.



A-lohkon julkisivumuurauksia



A-lohkon väliseiniä

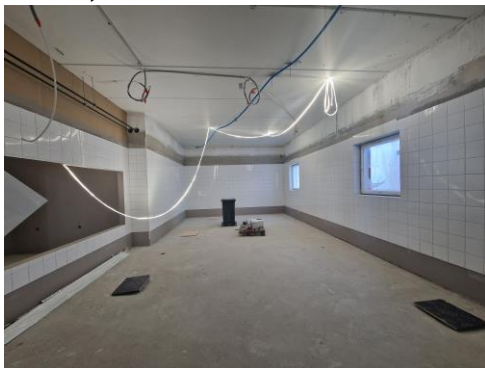

Astianpesutilan seinälaatoitukset



C-lohkon teräsrunkoa



B-lohkon 3.kerros pintaalaan valmistelevia töitä

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergvist on myöntänyt Napsun monitoimitalon urheilukentälle liikuntapaikkarakentamisen avustusta 390 210 euroa. Valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin

rakennettavien liikuntapaikkojen rakentamiseen, perusparannukseen tai näihin liittyviin varustuksiin.

Keväällä 2024 Rovaniemen kaupunki kilpailutti varhaisen vaiheen hankintamenettelyllä irtokalustetoimittajakumppanin monitoimitaloon. Irtokalustetoimittajaksi valittiin Isku Oy. Irtokalustehankinnan arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kilpailutuksessa huomioitiin sekä uudisrakennus ja pienten koulun puoli. Syksyn 2024 aikana suunnittelu toteutetaan yhteistyössä käyttäjiä ja sidosryhmiä osallistaen.

Napsun monitoimitalon pienten koulun (D- osa) suunnittelu etenee toteutussuunnitelmavaiheessa. Pääsuunnittelijaksi on valittu arkkitehti Eija Rantala Arkkitehdit Rantala & Kankaanpää Oy:stä. Käyttäjien kanssa suunnitelmia on tarkasteltu kevään 2024 aikana toiminnallisella tasolla ja seuraavaksi edetään erikoissuunnitteluun.

Koulun väki saa pian aloittaa ansaitun kesäloman. Lämmin kiitos kaikille lukukauden aikana tehdystä hyvästä yhteistyöstä. Yhdessä onnistumme ja pääsemme nauttimaan hyvästä lopputuloksesta. Aurinkoisia lomapäiviä!

Yhteistyössä:

Eemeli Antinmaa

eemeli.antinmaa@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi
