

Viikkotiedote 12–13

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien asennus
- peltityöt, dokumentointi, irrotus, aluskermin asennus ja uusien peltien asennus
- julkisivurappauksen pohjatyöt ja ikkunan piilien etuputsi
- julkisivun kivisaumaus
- puurakenteiden korjaukset
- ikkunakunnostus
- LVI-työt. IV-konehuonetyöt, kanava-asennus, lämpö- ja jäähdytyslinjojen asennus
- sähkötyöt, konehuoneiden asennustyöt ja yleiskaapelointi
- kipsilevytyöt tilamuutosalueella valmiit, ruiskualakatot käynnissä
- maalaus, rappaus ja tasoitustyöt sisällä
- mattotyöt alkaneet pohjakerroksessa pohjatöillä
- Halkopihan lasikaton pystyrungon pilareiden ja palkkien asennus



Kuva 1. Kivisaumojen avausta.

Kansallismuseon peruskorjaustyömaan Virastosiiven toisen kerroksen toimistotilojen maalaus ja rappaustyöt on saatu päätökseen. Taitava sisärakennustiimi teki upeaa jälkeä palauttaessaan tilojen alkuperäiset värisävyt. Nyt tiloista on poistettu kaikki rakentamisen aikainen materiaali ja kulkijoita tiedotetaan työn valmistumisesta, jotta valmiit pinnat eivät kolhiinnu tai naarmuunnu.



Kuva 2. Pohjamaalausta.



Kuva 3. Alakaton akustoruiskutusta.




Kuva 4. Valmista maalipintaa.

Peltityöt etenevät työmaalla hyvin. Katoille asennetaan kattopeltejä, harjapeltejä, räystäskouruja sekä mm. alkuperäisiä, käsin taottuja valjaskoukkuja, jotka poistettiin välillä katto töiden tieltä. Kolmannen lanterniinin huippu on jo saatu kunnostettua verstaalla ja se odottaa paikoilleen nostoa.



Kuva 5. Valjaskoukkuja odottamassa paikoilleen asennusta.

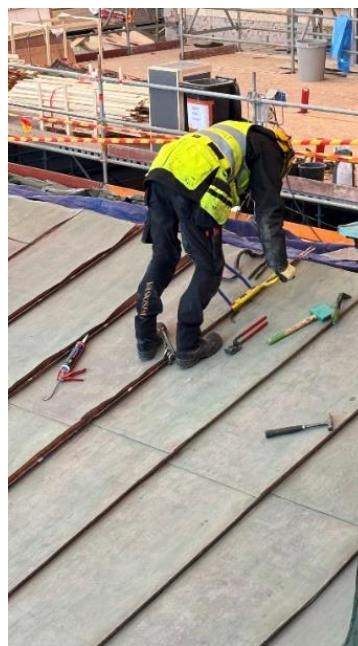

Kuva 6. Kattopellitystä.



Kansallismuseon peruskorjaustyömaa osallistuu vuoden 2025 valtakunnalliseen työturvallisuuskilpailuun. Kilpailussa palkitaan vuosittain rakennustyömaa, jolla työturvallisuusasiat on hoidettu esimerkillisen hyvin. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2010 alkaen.

NCC: llä työturvallisuus otetaan vakavasti ja meidän mottomme on -Terveenä kotiin. Jo sopimuksenteko vaiheessa, mietitään yhdessä urakoitsijoiden kanssa, mitä vaarallisia vaiheita työhön liittyy. Ennen töiden aloitusta työmaalla, työntekijöiden kanssa tehdään työnturvallisuussuunnitelma (TTS), jolla poistetaan turvallisen työnteon esteitä. Työmaaperehdytyksessä opastetaan kaikkia työmaalla liikkuvia turvalliseen työskentelyyn ja neuvotaan ensiapua sekä toimintaa hätätilanteissa. Turvallisella työmaalla kaikki työntekijät huolehtivat paitsi omastaan, niin myös kaverin työturvallisuudesta.

TR-mittaus on lakisääteinen rakennustyömaan turvallisuusmittausmenetelmä, joka on kunkin työmaan vastuullisen urakoitsijan velvollisuus. TR lyhenne tulee sanasta talonrakennus. Kansallismuseon peruskorjaustyömaan TR- mittauksen keskiarvo on tällä hetkellä huikea 99,31 %, kun kokonaisindeksitavoite NCC: llä on vähintään 97 %. Hyvästä työturvallisuustasosta huolimatta, työmaalla pyritään koko ajan parantamaan turvallisuusasioissa ja kilpailuun osallistuminen on meille kunnia-asia.

Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki
