

# Viikkotiedote 52/2024–3/2025

## Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



### Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien dokumentointi, irrotus ja asennus
- peltityöt, dokumentointi, irrotus, aluskermin asennus ja uusien peltien asennus
- räystäskoukut ja lanterniinien kunnostus, halkopihan räystääiden purku
- julkisivurappauksen purku- ja pohjatyöt, halkopihan rappauspurut aloitettu
- säästettävien rakennusosien suojaus julkisivulla
- julkisivun kivisaumojen avaaminen, parvekkeen kuntotutkimus ja koeaukaisu
- ikkunakunnostus
- LVI-työt. IV-konehuonetyöt, kanava-asennus, lämpö- ja jäähdytyslinjojen asennus
- sähkötyöt, konehuoneiden asennustyöt, yleiskaapelointi ja paloilmaisimet
- kipsilevy- ja alakattotyöt
- rappaus ja tasoitustyöt sisällä
- telineasennukset valmiit, telineet tarkastettu ja vastaanotettu



Kuva 1. Maalausmallien tarkastelua.

Kansallismuseon peruskorjauksen yhteydessä museon sisäpuolella uudistetaan seinä- ja kattopintoja, mutta kaikkia tiloja ei pintakäsitellä kokonaisuudessaan. Väriyksessä seurataan tilojen edellisessä peruskorjauksessa toteutettua väritystä. Vuosien varrella värisävyt ovat voineet muuttua, joten kaikista sävyistä tehdään ensin maalausmallit, jotka hyväksytetään arkkitehdillä ja Museoviranomaisella. Kartonkimalleja on tehty satoja, koska värisävyjen lisäksi malleissa huomioidaan eri kiiltoasteet. Osaan tiloista tulee erikoismaaleja, kuten pellavaöljymaalit, joista tehdään omat mallinsa. Kansallismuseon ikkunat on suojattu, mikä estää luonnonvalon pääsyn pintakäsiteltäville alueille. Mallikatselmuksia varten onkin tuotu teatterivalaisin, joka toistaa mallien sävyt oikein.



Kuva 3. Pintojen suojausta museon sisäpuolella.




Kuva 2. Sisäseinien tuplausta.



Kuva 4. Halkopihan lasikaton räystäslämmitysmalli.



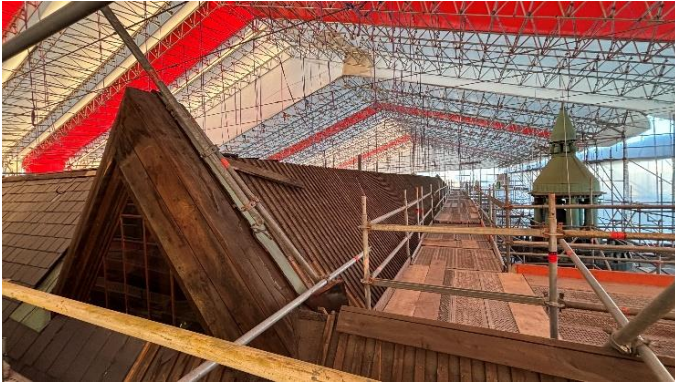

Kuva 5. Liuskekivipurkua Kansantieteellisen osan itälapeella.

Kansallismuseon massiiviset sääsuojat valmistuivat ennen joulua ja nyt suurin osa Kansallismuseota on sääsuojan peitossa. Sääsuojan alla työt ovat hyvässä vauhdissa. Siellä suojataan, puretaan, korjataan, ja uudistetaan pintoja ja rakenteita.



Kuva 6. Kattopellitystä ja räystäspellitystä Virastosiiven länsilapeella.



Kuva 7. Museon valmista julkisivua etelään.

Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, [tuomas.nousiainen@ncc.fi](mailto:tuomas.nousiainen@ncc.fi) 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, [ari.kiiskinen@senaatti.fi](mailto:ari.kiiskinen@senaatti.fi)

[www.facebook.com/kansallismuseontyomaa](https://www.facebook.com/kansallismuseontyomaa), [www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa](http://www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa),  
[www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki](http://www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki)
